



かりがこ しゆくしょう
仮囲い縮小

竣工写真撮影のため、仮囲いをさらに縮小しました。

竣工写真


大判のフィルムを用いて竣工写真の撮影をしています。



リーフレット

今年度のリーフレットが完成しました。



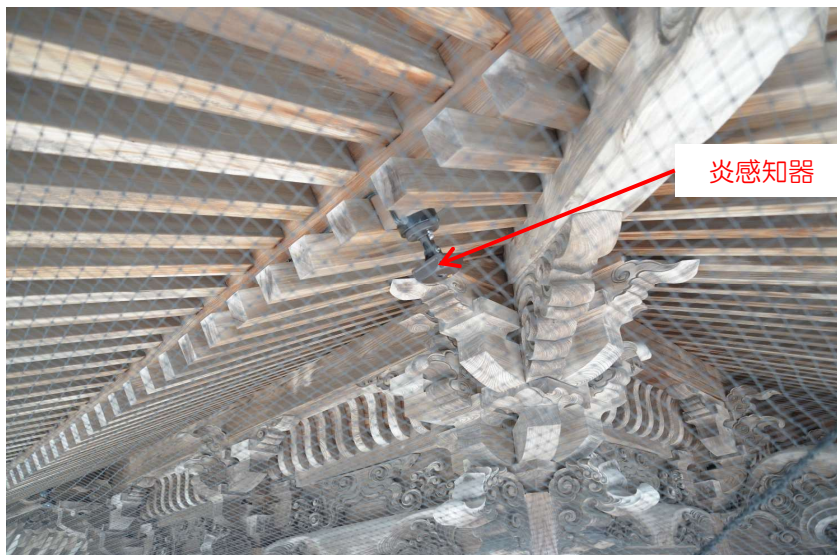

しんでんぐん しかほうせつび
神殿群 自火報設備

三つの神殿を火災から守るため炎感知器の取替を行いました。
 軒下と縁下にそれぞれ設置しています。

神殿群 消火栓

神殿群の消火栓の取替も行っていきます。消火栓を設置するための配管と基礎を施工しています。



神殿群 足場解体

炎感知器を取り替えるにあたり、防鳥ネットをはがす必要があったため、今回の工事で防鳥ネットも取り替えました。

